令和元年度　西下第10号

工　事　名　坂井輪排水区坂井輪幹線51-1管更生工事

工事場所　新潟市西区小針2丁目他　地内

工　　期　自　令和　2 年　3 月　23 日
　　至　令和　3 年　3 月　15 日　（358日間）

計　画　工　程　表

（1目盛を10日とする）

北栄建設株式会社　新潟支店
新潟市中央区美咲町1丁目23番地51号
TEL　025－285－2172
FAX　025－283－7944
現場代理人　　遠藤　安男

工　種	種　別	数量	備考
準備工		1　式	
管渠更生工			
準備工 管渠内調査・モルタル撤去工 ・管渠洗浄工	□3600mm×3600mm	79.27　m	
製管工 製管工・溶接工	□3400mm×3400mm	79.27　m	100%
裏込注入工 支保工兼浮上防止工	300<≦高さ≦5000 1700≦幅　≦5750	79.27　m	90%
注入工		112　m^3	80%
管口仕上工 流入管口切断シール工	0.64m2以下	3　箇所	70%
製管機据付・撤去工 製管機組立・搬出工		2　式	60%
付帯工 足掛金物設置撤去工	撤去 10本 設置 10本	1　式	50%
			40%
跡片付け工	跡片付け・竣工図書作成	1　式	30%
			20%
			10%
			0%

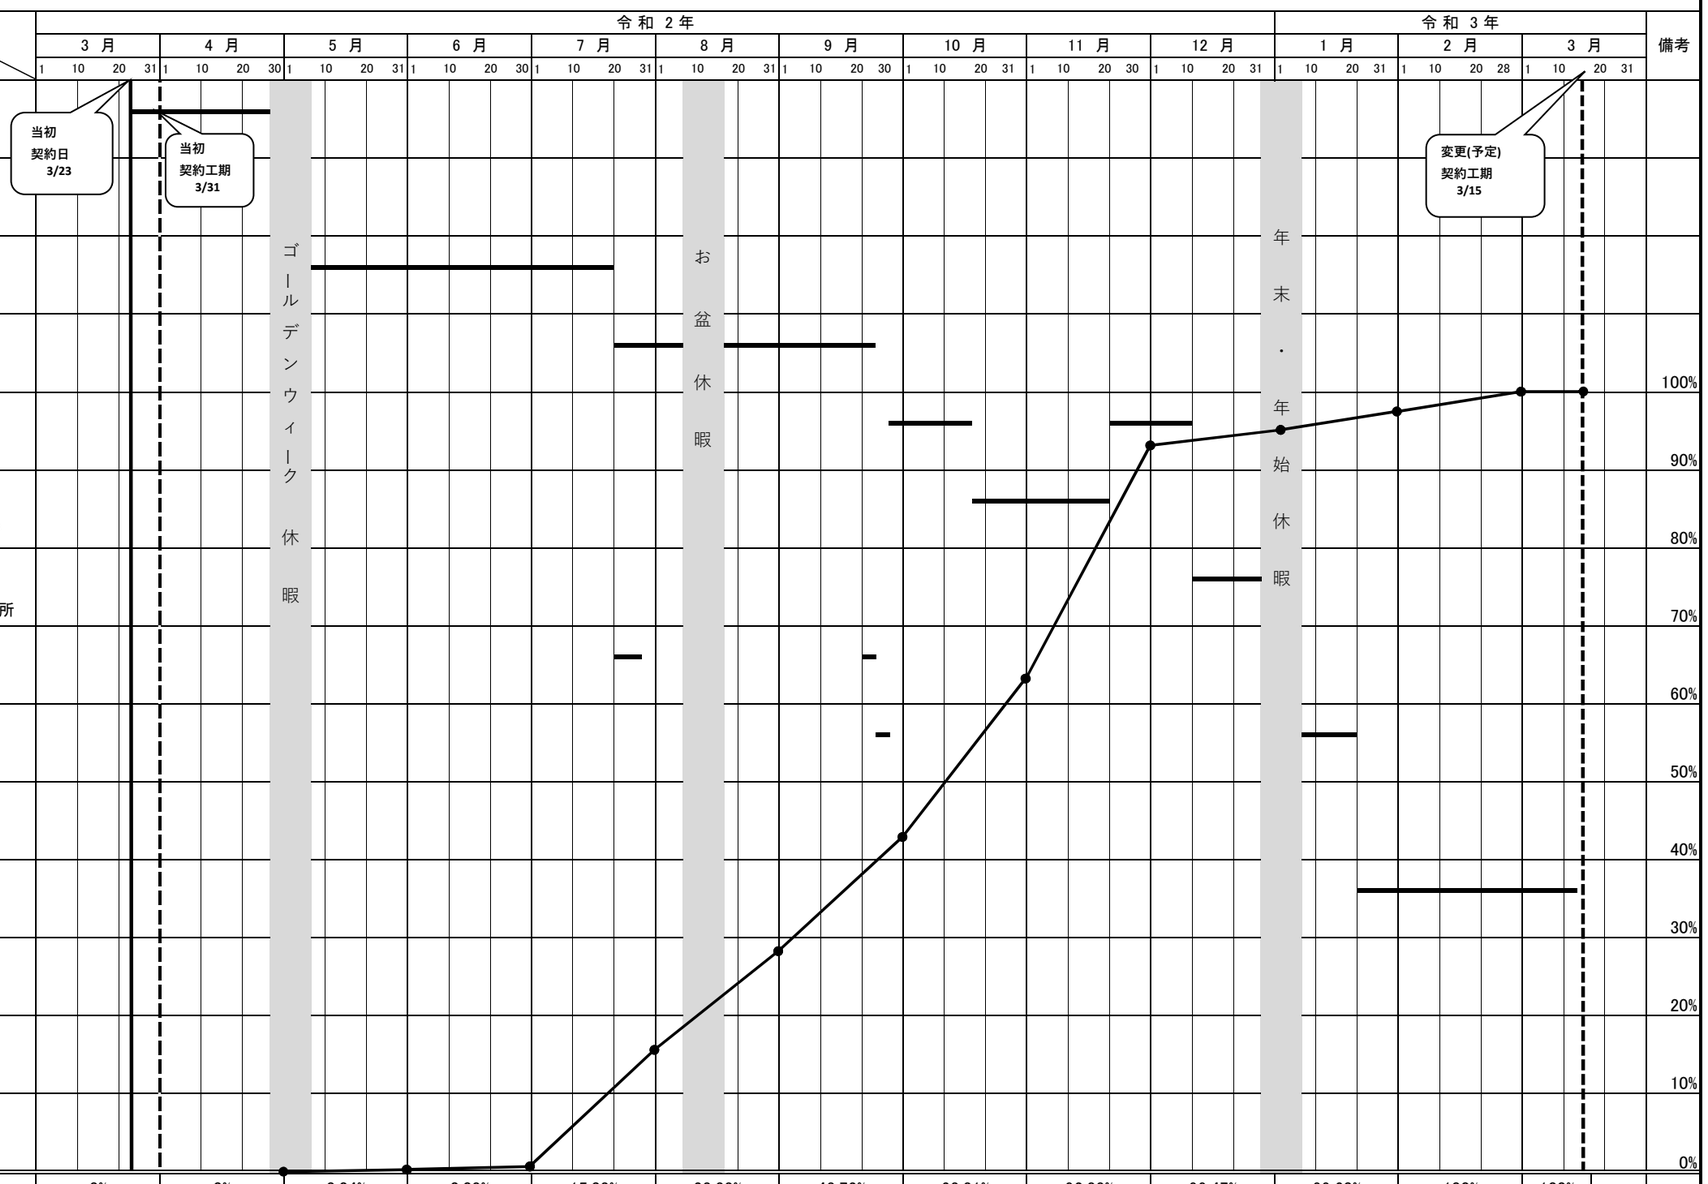

摘　要		3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
	当初計画	0%	0%	0.04%	0.08%	15.08%	28.33%	43.72%	63.31%	92.83%	99.47%	99.60%	100%	100%	
	実　施														
